




Génie Civil

VUFFLENS-LA-VILLE – CHEMIN DE LA MÉSANGE Remplacement d'une conduite d'eau potable

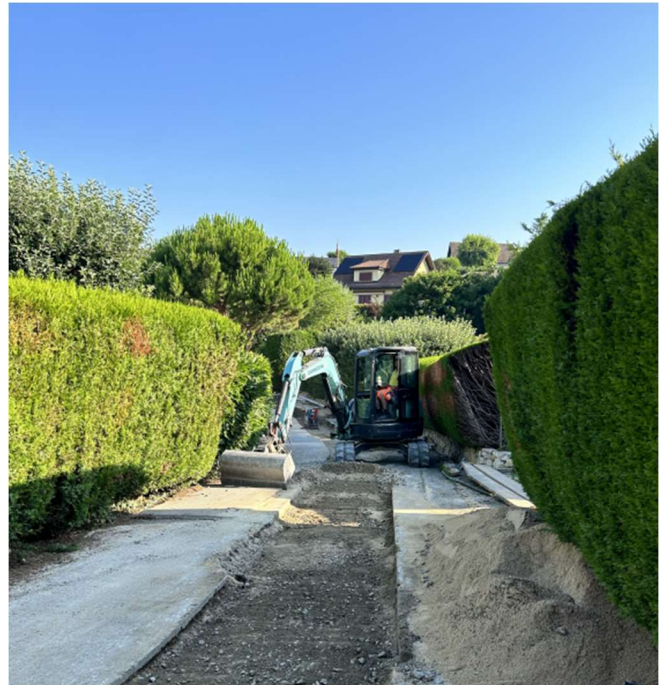

DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Travaux de génie civil comprenant :

- Remplacement de la conduite existante d'eau potable en Eternit DN 100mm par une nouvelle conduite en PE 100, PN 10 d'un diamètre de 160/141mm sur une longueur d'environ 175m.
- Changement des prises des raccordements « des privés » jusqu'au bord du chemin.
- Réfection du revêtement bitumineux uniquement sur la largeur des fouilles.

CONTRAINTES DE CHANTIER

Fouilles par étape
Rue en cul de sac

QUANTITES PRINCIPALES

Type	Quantité	Unité
Coupe revêtements bitumineux	780	ml
Fraisage revêtements	330	m2
Démolition bordurettes, pavés	20	ml
Fouilles en tranchée U prof jusqu'à 1.5 m	306	m3
Consolidation et protection de conduites	180	ml
Blindage de fouilles prof. jusqu'à 2m	600	m2
F+P sable lavé 0/4, Grave GNT 0/45, Grave 0/22 – Recyclée 0/45	295	m3
F+P géotextile	350	m2
F+P tuyaux PVC-U SN2 SDR 51 DN 200	10	ml
F+P géotextile	350	m2
F+P pavés et bordurettes granit	60	ml
Encollage	350	m2
F+P revêtements bitumineux ACT 16 N – AC 11 N	90	to
Exécution de rampe en enrobé bitumineux ACB 11 S	150	ml
Pose de regards de vannes en fonte	30	pces
F + Exécution d'avaloirs en béton préfabriqué DN 600	1	pce



INTERVENANTS

MAÎTRE DE L'OUVRAGE	
Adresse	Commune de Vufflens-la-Ville Rue de la Poste 10 1302 Vufflens-la-Ville
Téléphone	021 864 53 88
Adresse mail	commune@vufflens-la-ville.ch
Nom & Prénom contact	GRUAZ Michel
Téléphone contact	079 611 68 34
Mail contact	michel.gruaz@vufflens-la-ville.ch

INGÉNIEUR / DIRECTION DES TRAVAUX	
Adresse	Chevalier SA 36 Rue des Charpentiers CP 1110 Morges 1
Téléphone	021 804 75 40
Adresse mail	ing@chevaliersa.ch
Nom & Prénom contact	VISCARDI Olivier
Téléphone contact	079 794 08 70
Mail contact	ing@chevaliersa.ch

RESPONSABLES AU SEIN DE L'ENTREPRISE	
Technicien	BEGUELIN Yannick
Contremaître	DE JESUS MATEUS Eduardo

PERIODE DE REALISATION	
Mai 2023	Juin 2023

MONTANT DES TRAVAUX	
CHF	140'500.-

PHOTOS

